LAPORAN PENDAHULUAN · VERSI MUDAH DIBACA

Penyusunan Proses Bisnis dan Arsitektur Aplikasi Dasbor Kawasan Sabang

Menata ulang cara kerja setiap unit dan layanan BPKS agar saling terhubung, memakai satu sumber data, dan dapat dipantau pimpinan melalui satu dasbor.

Pemberi kerja	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) · Biro Perencanaan dan Sistem Informasi
Penyedia jasa	CV. Pulau Weh Perkasa
Tahun anggaran	2026 · Bagian Anggaran 118 · 60 hari kalender
Status dokumen	Draf untuk Rapat Pendahuluan / FGD-1 · 8 Oktober 2026

> Sebagian besar isi Bab 5–14 adalah **usulan konsultan**. Isi tersebut baru berlaku setelah dibahas dan disepakati BPKS dalam Berita Acara.

Daftar Isi

Cara Membaca Laporan Ini

Ringkasan untuk Pimpinan

Bab 1: Latar Belakang: BPKS, Kawasan Sabang, dan Mengapa Perlu Dasbor

Bab 2: Batas Pekerjaan: Apa yang Dikerjakan dan Apa yang Tidak

Bab 3: Tujuh Hal Penting yang Perlu Diketahui Sejak Awal

Bab 4: Gambaran Besar Cara Kerja BPKS

Bab 5: Proses Bisnis Baru (To-Be) per Kedeputian dan Unit

Bab 6: Peta Layanan BPKS

Bab 7: Keterkaitan Antarlayanan: Empat Rantai Utama

Bab 8: Satu Data, Satu Sumber Resmi

Bab 9: Hubungan dengan RPJMN dan RPJPN

Bab 10: Siapa Melakukan Apa

Bab 11: Rencana Kerja 60 Hari, Kebutuhan Data, Keputusan, dan Risiko

Bab 12: Keselarasan dengan Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)

Bab 13: Rancangan Kepuasan Pengguna dan Dukungan Pengguna

Bab 14: Manajemen Proyek

Glosarium

Lampiran: Dasar Hukum dan Sumber Rujukan

Cara Membaca Laporan Ini

Laporan ini ditulis agar bisa dipahami pembaca yang tidak berlatar belakang teknologi informasi. Istilah teknis dijelaskan saat pertama muncul dan dikumpulkan di **Glosarium** di bagian akhir.

Dua jenis hasil pekerjaan

Tanda	Arti	Sifat
A	**Keluaran A: hasil kontrak.** Proses dan rancangan yang dibutuhkan untuk menjalankan dasbor.	Mengikat; wajib diserahkan dalam paket ini.
B	**Keluaran B: masukan untuk BPKS.** Peta proses seluruh unit dan peta layanan yang menjadi bahan pembaruan Arsitektur SPBE BPKS.	Usulan konsultan; baru berlaku setelah disepakati BPKS.

Tingkat keyakinan

Setiap pernyataan penting diberi label agar pembaca tahu seberapa kuat dasarnya:

Label	Artinya
Pasti	Didukung bukti kuat: teks peraturan, dokumen resmi, atau data dari BPKS.
Kemungkinan Besar	Kesimpulan kuat dari beberapa petunjuk, tetapi belum dicek ke dokumen resminya.
Menebak	Perkiraan untuk mengisi kekosongan informasi. Wajib dikonfirmasi BPKS.

Kotak penjelasan

> **Penjelasan sederhana**
>
> Kotak biru berisi penjelasan dengan bahasa sehari-hari atau perumpamaan.

> **Perhatian**
>
> Kotak oranye berisi risiko atau hal yang perlu diputuskan pimpinan.

Ringkasan untuk Pimpinan

Dalam 60 hari, paket ini realistis menghasilkan **satu hal yang final**: rancangan cara kerja (proses bisnis) dan rancangan aplikasi dasbor yang menampilkan capaian Renstra BPKS 2025–2029 sampai tingkat program. Peta proses seluruh unit dan peta layanan BPKS tetap disusun, tetapi sebagai **usulan** untuk dibahas bersama.

Lima hal yang paling penting

1. **Lingkup pekerjaan perlu dikunci di minggu pertama.** Permintaan untuk memetakan ulang proses semua unit dan semua layanan pada dasarnya adalah pekerjaan Arsitektur SPBE organisasi, jauh lebih besar dari paket dasbor 60 hari. Kami usulkan **Berita Acara Kesepakatan Lingkup** ditandatangani paling lambat hari ke-7. Pasti
2. **Dasbor tidak bisa hanya mengandalkan SAKTI dan KRISNA.** Kedua sistem itu hanya berisi target dan data keuangan. Capaian penting seperti nilai investasi, jumlah perusahaan, kapal pesiar, dan kunjungan wisatawan tidak ada di sana. Data ini harus diisi unit melalui formulir (G-form) dan diperiksa Biro Perencanaan dan Sistem Informasi. Kemungkinan Besar
3. **Renstra 2025–2029 memiliki beberapa ketidakcocokan** yang akan langsung terlihat di dasbor: indikator 2025 berbeda total dengan 2026–2029, ada dua indikator dengan nama sama, dan Kegiatan Utama perikanan (PPBK) tidak punya indikator sama sekali. Pasti
4. **Organisasi menjadi kuat bila layanannya tersambung.** Kasus izin pemasukan 250 ton beras (Oktober–November 2025) menunjukkan akibatnya bila izin, kuota, realisasi di Bea Cukai, dan pengawasan berjalan sendiri-sendiri. Pasti
5. **Dibandingkan BP Batam, kekurangan BPKS bukan pada kewenangan**, melainkan pada tiga layanan: informasi lahan secara daring, pendampingan investor, dan layanan data kawasan. Kemungkinan Besar

Keputusan yang dimohon dari pimpinan

1. Menyetujui Berita Acara Kesepakatan Lingkup (pembedaan Keluaran A dan B).
2. Menunjuk penanggung jawab data (PIC) di setiap unit.
3. Menyelesaikan indikator kembar (IKP-EH-5.1 dan 4.1) dan menentukan perlakuan PPBK di dasbor.
4. Menetapkan satu definisi nilai investasi: LKPM yang sudah disetujui di OSS.
5. Menentukan apakah dasbor juga dibuka untuk publik.
6. Menegaskan pembagian tugas Inspektorat/SPI dan Deputi Pengawasan.
7. Menyetujui Keluaran B sebagai bahan Arsitektur SPBE (anggaran 2027).

Bab 1 · Latar Belakang: BPKS, Kawasan Sabang, dan Mengapa Perlu Dasbor

1.1 Apa itu BPKS dan Kawasan Sabang

Kawasan Sabang adalah **Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)**: wilayah khusus di mana barang dapat masuk dan keluar dengan aturan kepabeanan yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Kawasan ini dibentuk oleh UU 37/2000. Pasti Pengelolanya adalah **BPKS**, yang bekerja di bawah arahan Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang diketuai Gubernur Aceh. BPKS berstatus Badan Layanan Umum (BLU), artinya BPKS boleh mengelola sendiri pendapatan dari layanannya. Pasti

> **Wilayahnya lebih luas dari Kota Sabang**
>
> Menurut PP 83/2010, Kawasan Sabang mencakup **Kota Sabang** (Pulau Weh, Klah, Rubiah, Seulako, Rondo) **dan sebagian Kabupaten Aceh Besar** (Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom). Pasti Ini penting untuk data: angka "Kota Sabang" dari BPS atau Pemkot **tidak sama** dengan angka "Kawasan Sabang".

1.2 Kewenangan BPKS

Pemerintah melimpahkan banyak kewenangan kepada DKS yang dijalankan oleh BPKS, antara lain Pasti :

- **Perizinan** di bidang perdagangan, perindustrian, energi, perhubungan, pariwisata, kelautan dan perikanan, serta penanaman modal. Izin berusaha diterbitkan melalui sistem nasional **OSS** (PP 28/2025).
- **Izin pemasukan dan pengeluaran barang** ke dan dari kawasan, termasuk barang konsumsi yang hanya boleh beredar di dalam kawasan (PP 41/2021).
- **Pengelolaan kawasan**: tata ruang, lingkungan hidup, kerja sama, investasi, pengelolaan aset, dan pelabuhan (Pelabuhan Teluk Sabang dan Pelabuhan Penyeberangan Balohan).

1.3 Masalah yang ingin diselesaikan

Data tentang Kawasan Sabang saat ini tersebar di banyak tempat: unit-unit BPKS, Pemko Sabang, Pemkab Aceh Besar, dan instansi pusat seperti Bea Cukai, KSOP, dan Kementerian Investasi. Laporan masih banyak disusun manual menjelang tenggat. Akibatnya, angka yang sama bisa berbeda di dua laporan, dan pimpinan sulit mendapat gambaran utuh dengan cepat.
Kemungkinan Besar

> **Perumpamaan**
>
> Bayangkan sebuah kapal dengan sepuluh awak yang masing-masing mencatat kecepatan, bahan bakar, dan arah di buku sendiri. Nakhoda harus bertanya satu per satu, dan jawabannya kadang berbeda. Dasbor adalah **panel kemudi bersama**: semua angka tampil di satu layar, berasal dari alat ukur yang sama, dan diperbarui secara teratur.

1.4 Apa itu dasbor dan apa gunanya

Dasbor adalah tampilan layar yang merangkum angka-angka penting dalam bentuk grafik, peta, dan tabel. Sesuai rancangan halaman utama yang diberikan BPKS, dasbor memiliki tiga menu:

Menu	Isi	Contoh
Kegiatan Utama	Tiga program strategis dan lokasi proyeknya	Pengembangan Pelabuhan (PKS), Pariwisata Terintegrasi (PTKS), Pelabuhan Perikanan dan Budidaya (PPBK)
Capaian	Realisasi keuangan dan capaian indikator Renstra 2025–2029	Realisasi anggaran, nilai investasi, IKPA, opini BPK
Statistik	Tabel data kawasan dari tahun ke tahun	Realisasi investasi, jasa kepelabuhanan, pemanfaatan aset

Bab 2 · Batas Pekerjaan: Apa yang Dikerjakan dan Apa yang Tidak

Batas pekerjaan perlu jelas sejak awal agar tidak ada harapan yang berbeda di akhir. Rapat bersama BPKS sudah memutuskan beberapa hal yang mempersempit lingkup: Pasti

- Renstra yang dipakai hanya periode **2025–2029**.
- Indikator dibatasi sampai **tingkat program**.
- Sumber data dari sistem hanya **SAKTI** (keuangan) dan **KRISNA** (perencanaan).
- Data kunjungan wisatawan dicatat oleh **Pemkot Sabang**.
- Kebutuhan data dikumpulkan dengan **G-form**.

Aspek	Termasuk pekerjaan	Tidak termasuk
Proses bisnis	Delapan proses dasbor (PB-01 s.d. PB-08) secara rinci; peta proses tiap unit sebagai usulan	Prosedur rinci (SOP) semua unit; penetapan struktur organisasi
Arsitektur	Rancangan aplikasi **dasbor**	Arsitektur SPBE BPKS secara utuh
Indikator	Indikator sasaran (IKSS) dan program (IKP) Renstra 2025–2029	Indikator kegiatan dan rincian output
Sumber data	SAKTI, KRISNA, dan G-form	Penyambungan ke OSS, Inaportnet, CEISA, SIMAN, OM-SPAN, SIPTL (hanya rencana ke depan)
Teknis	Rancangan G-form inventaris data	Membangun aplikasi jadi, membeli perangkat, menyambungkan sistem, memindahkan data, menetapkan klasifikasi data

Mengapa Berita Acara Kesepakatan Lingkup penting

Tanpa kesepakatan tertulis, pekerjaan mudah melebar (istilahnya *scope creep*): satu permintaan tambahan dianggap kecil, tetapi bila menumpuk, jadwal 60 hari tidak terpenuhi. Bila BPKS membutuhkan prosedur rinci untuk semua unit, standar pelayanan final untuk setiap layanan, Arsitektur SPBE enam domain, atau dasbor yang tersambung langsung ke sistem, hal itu sebaiknya dituangkan dalam **adendum**.

Bab 3 · Tujuh Hal Penting yang Perlu Diketahui Sejak Awal

Bagian ini sengaja ditempatkan di depan karena memengaruhi seluruh pekerjaan.

1. **Struktur organisasi yang dipakai sudah lama** Pasti

   Susunan organisasi BPKS masih mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2014. Dewan Pengawas pada Agustus 2025 meminta rancangan struktur baru segera dituntaskan. Karena itu peta proses kami susun **berdasarkan fungsi**, bukan nama unit, agar tetap berlaku bila struktur berubah.

2. **Uraian tugas resmi tiap unit belum bisa kami cek** Pasti

   Dokumen tugas pokok dan fungsi tiap unit tidak dapat kami akses selama penyusunan. Uraian tugas di Bab 5 adalah perkiraan berlabel dan harus dicocokkan dengan salinan Pergub 17/2014.

3. **Arsitektur SPBE BPKS sudah habis masa berlakunya** Pasti

   Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE BPKS berlaku 2022–2024. Dasbor tidak bisa menggantikannya; paket ini hanya menyumbang bahan.

4. **Dua sumber sistem tidak cukup untuk dasbor** Kemungkinan Besar

   Dari 41 indikator Renstra, hanya sekitar 5 yang capaiannya bisa diambil penuh dari SAKTI/KRISNA. Sisanya harus diisi unit melalui formulir.

5. **Renstra memiliki ketidakcocokan** Pasti

   Indikator 2025 (sasaran SS-1 s.d. SS-4) berbeda total dengan 2026–2029 (SS-5 s.d. SS-7); IKP-EH-5.1 bernama sama dengan IKP-EH-4.1; PPBK tidak punya indikator. Usulan kami: tampilkan apa adanya dengan keterangan "indikator belum terdefinisi", jangan disembunyikan.

6. **Layanan yang tidak tersambung sudah menimbulkan masalah** Pasti

   Pada 24 Oktober 2025 BPKS menerbitkan izin pemasukan 250 ton beras asal Thailand. Bea Cukai kemudian masih menunggu dokumen kepabeanan (PPFTZ), lalu rapat koordinasi meminta BPKS menetapkan kuota barang konsumsi dan membentuk tim pengawasan peredaran. Artinya, urutan izin → kuota → realisasi → pengawasan belum terbangun.


7. **Data pejabat tidak seluruhnya mutakhir** Kemungkinan Besar

   Beberapa pejabat dilantik Oktober 2025; jabatan lain, termasuk Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi, mungkin sudah berganti. Ini perlu dicek karena biro tersebut adalah pemilik paket dan pengelola data.

Bab 4 · Gambaran Besar Cara Kerja BPKS

Sebelum masuk ke tiap unit, kita lihat dulu BPKS sebagai satu kesatuan. Cara yang lazim adalah **rantai nilai**: mengelompokkan kegiatan menjadi kegiatan inti (yang langsung menghasilkan manfaat bagi pengguna), kegiatan pendukung, dan kegiatan manajemen. Pengelompokan ini adalah usulan konsultan. B

MANAJEMEN: perencanaan, evaluasi kinerja, data dan dasbor, pengendalian intern, audit, reformasi birokrasi

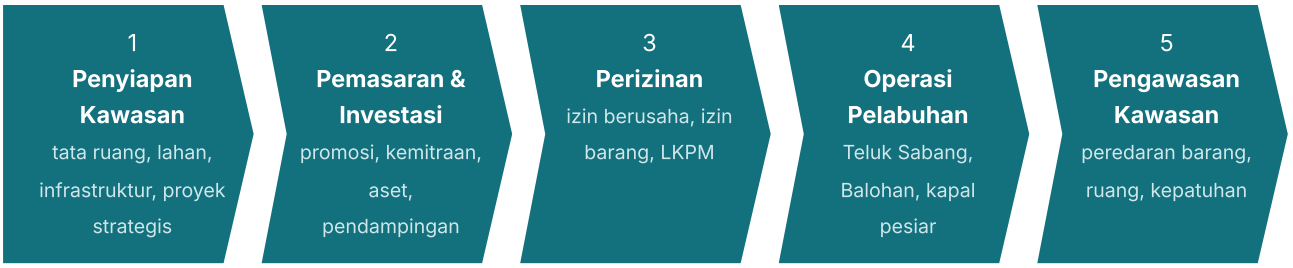

PENDUKUNG: keuangan dan BLU, aset (BMN), SDM, hukum, pengadaan, teknologi informasi dan keamanan, humas dan informasi publik

Kelompok	Fungsi	Unit utama
Inti 1 – Penyiapan Kawasan	Tata ruang, lahan (HPL), infrastruktur, proyek strategis PKS, PTKS, PPBK	Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang
Inti 2 – Pemasaran & Investasi	Promosi, fasilitasi investor, kemitraan, pemanfaatan aset, pendampingan investor	Deputi Komersial dan Investasi
Inti 3 – Perizinan	Izin berusaha (OSS), Tanda Pengenal Pengusaha (TPP), izin barang, verifikasi LKPM	Unit Pelaksana PTSP
Inti 4 – Operasi Pelabuhan	Pelabuhan Teluk Sabang, Pelabuhan Balohan, kapal pesiar dan yacht	Unit Manajemen Pelabuhan (UMP)
Inti 5 – Pengawasan Kawasan	Peredaran barang, pemanfaatan ruang dan aset, kepatuhan setelah izin terbit	Deputi Pengawasan
Pendukung	Keuangan/BLU, BMN, SDM, hukum, pengadaan, TI, keamanan informasi, humas/PPID	Biro Keuangan, Biro Umum dan Humas, Deputi Umum, Biro PSI, CSIRT
Manajemen	Perencanaan, SAKIP, data dan dasbor, SPIP, audit, Zona Integritas	Biro PSI, Inspektorat/SPI, pimpinan

Mengapa berbasis fungsi

Nama unit bisa berubah bila struktur organisasi baru ditetapkan, tetapi fungsi "menerbitkan izin" atau "melayani kapal" tetap ada. Dengan menyusun peta berdasarkan fungsi, hasil pekerjaan ini tidak usang ketika struktur berubah.

Bab 5 · Proses Bisnis Baru (To-Be) per Kedeputian dan Unit

Proses bisnis adalah urutan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, misalnya izin, layanan kapal, atau laporan. **To-be** berarti cara kerja yang dituju setelah perbaikan, sedangkan **as-is** adalah cara kerja sekarang.

> **Kondisi sekarang (as-is) secara umum**
>
> Data kinerja dikumpulkan menjelang pelaporan lewat surat dan lembar Excel; angka berbeda antarlaporan; belum ada daftar data dan penjelasannya (metadata); keterkaitan layanan bergantung pada rapat dadakan. Kemungkinan Besar Ini perlu dikonfirmasi dalam wawancara.

Untuk setiap unit, tabel berikut menjelaskan: proses apa yang dijalankan, hasilnya, dari mana datanya diambil, indikator Renstra yang didukung, dan jenis keluarannya (A atau B). Uraian tugas setiap unit masih perlu dicocokkan dengan Pergub 17/2014.

5.1 Deputi Umum

Tugas pokok: Mengurus SDM, hukum dan peraturan internal, tata laksana organisasi, dan membina biro-biro pendukung. Kemungkinan Besar

Proses	Hasilnya	Data dari	Indikator Renstra	Jenis
Pengelolaan SDM	Rencana pegawai, penilaian kinerja, survei kepuasan pegawai	Aplikasi kepegawaian	IKP-WA-4.5	B
Hukum dan Peraturan Kepala	Peraturan Kepala tentang kuota barang dan tarif; harmonisasi pelimpahan kewenangan	JDIH BPKS	IKSS-7	B
Tata laksana dan Zona Integritas	Peta proses dan SOP yang disahkan	Repositori proses (usulan)	IKSS-4.1	B
Pengawalan struktur organisasi baru	Analisis jabatan, usulan struktur ke Ketua DKS		IKSS-7	B

Yang berubah: SOP disusun dari rantai nilai. Setiap Peraturan Kepala yang memengaruhi layanan diberi "pemilik layanan".

5.2 Deputi Komersial dan Investasi

Tugas pokok: Promosi investasi, pemanfaatan aset/BMN, kerja sama, dan pengusahaan BLU. Kemungkinan Besar

Proses	Hasilnya	Data dari	Indikator Renstra	Jenis
Promosi investasi	Profil peluang investasi PKS, PTKS, PPBK; daftar calon investor	Aplikasi pengelolaan investor (usulan)	IKSS-5, IKP-EH-2.2, 4.1	B
Pendampingan investor (baru)	Satu petugas kontak dari minat sampai izin terbit	Aplikasi pengelolaan investor (usulan)	IKSS-5	B
Kemitraan dan pemanfaatan BMN	Perjanjian sewa, kerja sama pemanfaatan, tenant	SIMAN v2; SAKTI	IKSS-6, IKP-EH-3.1, 7.1, 7.2	A B
Pengusahaan BLU	Usulan tarif dan layanan baru	SAKTI	IKSS-3.1/3.3	A
Pendampingan setelah investasi (baru)	Memantau laporan LKPM dan membantu kendala investor	OSS (LKPM)	IKSS-5, IKP-EH-4.1	B

Yang berubah: Nilai investasi diambil dari LKPM yang sudah disetujui di OSS. Nota kesepahaman (MoU) dicatat sebagai "minat", bukan realisasi, agar angka investasi tidak menggelembung.

5.3 Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang

Tugas pokok: Tata ruang kawasan, perencanaan teknis, dan pembangunan infrastruktur. Kemungkinan Besar

Proses	Hasilnya	Data dari	Indikator Renstra	Jenis
Tata ruang kawasan	Rencana kawasan, termasuk Pulau Breuh, Nasi, Teunom	Peta digital (usulan)	IKSS-2.x, IKP-EH-6.1	B
Penyiapan lahan (HPL)	Daftar status lahan dan lahan siap ditawarkan	SIMAN v2; ATR/BPN	IKSS-6, IKP-EH-7.1	B
Manajemen proyek strategis	Proyek dari anggaran sampai aset jadi	KRISNA; SAKTI	IKP-EH-1.1/1.2/1.4, 6.1	A
Pemeliharaan infrastruktur	Rencana pemeliharaan dari hasil inspeksi	SIMAN v2	IKSS-2.1	B
Lingkungan dan energi terbarukan	Pengesahan dokumen lingkungan tenant	OSS	IKSS-2.2, IKP-EH-1.3	B

Yang berubah: PPBK diberi indikator proses sementara (selisih kemajuan fisik dan keuangan) sampai Renstra ditinjau ulang.

5.4 Deputi Pengawasan

Tugas pokok: Belum terverifikasi. Ada dua kemungkinan: mengawasi kawasan (barang, ruang, kepatuhan usaha) atau membawahi pengawasan internal. Usulan kami: Deputi Pengawasan mengawasi **kawasan**, sedangkan pengawasan **internal** dipegang Inspektorat/SPI yang melapor langsung kepada Kepala BPKS agar tetap independen. Menebak

Proses	Hasilnya	Data dari	Indikator Renstra	Jenis
Pengawasan peredaran barang	Mencocokkan izin barang dengan realisasi di Bea Cukai; mengawasi barang konsumsi	Aplikasi PTSP; dokumen PPFTZ	Belum ada indikator	B
Pengawasan pemanfaatan ruang dan BMN	Temuan pelanggaran oleh mitra	SIMAN v2	IKSS-6	B
Kepatuhan setelah izin terbit	Inspeksi berbasis risiko, rekomendasi sanksi	OSS	IKSS-5	B

Yang berubah: Pengawasan menjadi bagian dari rantai layanan, bukan kegiatan terpisah setelah ada masalah.

5.5 Biro Perencanaan dan Sistem Informasi (Walidata)

Tugas pokok: Perencanaan, evaluasi kinerja, dan sistem informasi. Biro ini juga diusulkan menjadi **walidata**: pengumpul, pemeriksa, dan penyebar data BPKS. Kemungkinan Besar

Proses	Hasilnya	Data dari	Indikator Renstra	Jenis
Perencanaan dan penganggaran	Pohon kinerja, Renja, RKA, penandaan prioritas nasional	KRISNA	Semua indikator	A
Evaluasi kinerja (SAKIP)	Capaian triwulanan, laporan kinerja	KRISNA + G-form	IKP-WA-1, 4.1	A
Pengelolaan data dan dasbor	Delapan proses dasbor PB-01 s.d. PB-08	Dasbor	IKP-WA-4.3, 4.4	A
Tata kelola SPBE	Arsitektur SPBE baru (usulan 2027–2031)		IKSS-3.3, 7	B

Yang berubah: Target di dasbor selalu sama dengan KRISNA. Angka di laporan kinerja selalu sama dengan dasbor.

5.6 Biro Keuangan

Tugas pokok: Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi BLU, dan pendapatan.
Kemungkinan Besar

Proses	Hasilnya	Data dari	Indikator Renstra	Jenis
Pelaksanaan anggaran	Realisasi anggaran; nilai IKPA	SAKTI; OM-SPAN	IKSS-7	A
Pendapatan BLU	Penagihan jasa pelabuhan, sewa, portal Balohan	SAKTI	IKSS-3.1, IKP-EH-7.1	A
Akuntansi dan laporan keuangan	Laporan keuangan, opini BPK	SAKTI	IKP-WA-1, 4.6	A
Dana di luar Rupiah Murni	Realisasi belanja dari pendapatan BLU	SAKTI	IKSS-3.2	A

Yang berubah: Tagihan di sistem pelabuhan dicocokkan dengan pendapatan di SAKTI; selisihnya harus nol.

5.7 Biro Umum dan Humas

Tugas pokok: Ketatausahaan, pengadaan, BMN (perlu dikonfirmasi apakah di biro ini atau Biro Keuangan), humas, dan dukungan PPID. Kemungkinan Besar

Proses	Hasilnya	Data dari	Indikator Renstra	Jenis
Penatausahaan BMN	BMN tercatat dan memiliki penetapan status penggunaan	SAKTI; SIMAN v2	IKSS-6, IKP-EH-3.1	A B
Pengadaan	Kontrak dari rencana umum pengadaan	SPSE/SiRUP		B
Humas, pengaduan, survei kepuasan	Tindak lanjut aduan; indeks kepuasan	SP4N-LAPOR!; survei	IKP-WA-4.3, 4.4	A B
Persuratan dan arsip	Naskah dinas elektronik	SRIKANDI	IKSS-7	B

Yang berubah: Survei kepuasan dilakukan untuk semua layanan dengan satu instrumen yang sama.

5.8 Unit Manajemen Pelabuhan (UMP)

Tugas pokok: Melayani kapal dan barang di Pelabuhan Teluk Sabang (dermaga CT-1 dan CT-3) serta Pelabuhan Penyeberangan Balohan, yang kembali dikelola BPKS sejak 1 Januari 2024. Pasti

Proses	Hasilnya	Data dari	Indikator Renstra	Jenis
Pelayanan kapal	Pengajuan kedatangan kapal (PKK), tambat, dermaga	Inaportnet (KSOP); sistem UMP	IKP-EH-1.1, 5.2	B
Pelayanan barang	Bongkar muat, penumpukan	Sistem UMP; izin PTSP	IKSS-3.1	B
Terminal Balohan	Portal kendaraan, parkir, tenant, manifes penumpang	E-portal; manifes operator	IKSS-3.1	B
Penagihan dan pencocokan	Nota layanan dicocokkan dengan setoran di SAKTI	Sistem UMP → SAKTI	IKSS-3.1	A

Yang berubah: Pembagian peran BPKS sebagai pengelola pelabuhan dan KSOP sebagai syahbandar perlu dikonfirmasi tertulis.

5.9 Unit Pelaksana PTSP

Tugas pokok: Pelayanan terpadu satu pintu: menerbitkan izin berusaha melalui OSS, Tanda Pengenal Pengusaha (TPP), dan izin pemasukan/pengeluaran barang. Pasti

Proses	Hasilnya	Data dari	Indikator Renstra	Jenis
Izin berusaha	NIB, perizinan berusaha, izin penunjang	OSS	IKP-EH-4.1, IKSS-5	B
TPP dan izin barang	Izin yang dicek terhadap kuota dan persyaratan teknis	Aplikasi PTSP	Tidak langsung	B
Verifikasi LKPM	Laporan investasi yang disetujui	OSS	IKSS-5	B
Standar pelayanan dan pengaduan	Indeks kepuasan masyarakat	SP4N-LAPOR!	IKP-WA-4.3	A

Yang berubah: Setiap izin barang harus bisa ditelusuri ke realisasinya di Bea Cukai.

5.10 Inspektorat/SPI, PPID, dan CSIRT


Tugas pokok: Pengawasan internal, layanan informasi publik, dan penanganan insiden keamanan siber. Kemungkinan Besar

Proses	Hasilnya	Data dari	Indikator Renstra	Jenis
Reviu dan evaluasi (Inspektorat/SPI)	Reviu laporan keuangan dan kinerja	Laporan hasil pengawasan	IKSS-4.2, IKP-WA-3	A
Pemantauan tindak lanjut temuan	Status rekomendasi BPK	SIPTL BPK	IKP-WA-4.2, 4.8	A
Layanan informasi publik (PPID)	Permohonan informasi, keberatan, daftar informasi	Portal PPID	IKP-WA-4.4	A
Penanganan insiden (CSIRT)	Respons insiden, termasuk dasbor	Catatan insiden	IKSS-7	B

Yang berubah: Keberadaan dan garis lapor Inspektorat/SPI serta SK CSIRT perlu dikonfirmasi.

5.11 Delapan Proses Dasbor (Keluaran A)

Ini adalah inti hasil kontrak: cara data mengalir dari unit ke layar pimpinan.



Kode	Proses	Apa yang terjadi	Pengaman utama
PB-01	Perencanaan kebutuhan data	Menyusun daftar data dan penjelasannya dari Renstra dan KRISNA	Satu indikator = satu definisi = satu sumber
PB-02	Pengumpulan dan pengisian	Unit mengisi G-form; data SAKTI/KRISNA diunduh	Ada petugas yang ditunjuk dan bukti pendukung

Kode	Proses	Apa yang terjadi	Pengaman utama
PB-03	Pemeriksaan	Walidata memeriksa data terhadap sumber resminya	Contoh: nilai investasi dicek ke LKPM di OSS
PB-04	Penggabungan data	Data SAKTI dan KRISNA diunggah terjadwal; sambungan otomatis (SPLP) menjadi rencana ke depan	Angka dasbor dicocokkan dengan sumber
PB-05	Penayangan	Data yang lolos pemeriksaan tampil di dasbor internal atau publik; dataset Statistik didaftarkan ke Portal Satu Data	Hak lihat sesuai klasifikasi data
PB-06	Pemantauan, manfaat, dan dukungan pengguna	Survei kepuasan pengguna dasbor dan layanan publik; meja bantuan (FDP) dengan SLA	IKP-WA-4.3; panel SLA dan panel kepuasan
PB-07	Pelaporan	Laporan kinerja, laporan ke Dewan Pengawas dan DKS diambil dari dasbor	Angka laporan = angka dasbor
PB-08	Hak akses dan pelindungan data pribadi	Siapa boleh melihat apa	Data ditampilkan agregat; ada catatan akses

PB-06 (pemantauan manfaat) dan PB-08 (hak akses) berjalan di sepanjang alur.

Bab 6 · Peta Layanan BPKS

Layanan adalah sesuatu yang diberikan BPKS kepada pihak lain dan bisa dirasakan langsung manfaatnya, misalnya izin, sandar kapal, atau informasi lahan. Peta layanan ini adalah usulan konsultan yang wajib dibahas dalam FGD. B

Prinsip penyusunan

- Satu layanan punya **satu pemilik**, **satu standar pelayanan**, dan **satu sumber data**.
- Layanan yang memakai sistem nasional (OSS, Inaportnet, CEISA) tetap dilayani lewat sistem itu, tidak dibuat ulang.
- Setiap layanan wajib punya standar pelayanan (PermenPANRB 15/2014) dan survei kepuasan masyarakat (PermenPANRB 14/2017). Hasil survei tampil di dasbor sebagai ukuran manfaat.

Status: Ada sudah berjalan baik · Perkuat sudah ada tetapi perlu diperbaiki · Baru belum ada dan perlu dibuat · Usulan perlu dibahas

6.1 Layanan untuk pelaku usaha dan masyarakat

Kode	Layanan	Pengguna	Penanggung jawab	Saluran	Status
L-01	**Izin berusaha (NIB, PB, PB UMKU)**	Investor	PTSP	OSS	Perkuat
L-02	**Tanda Pengenal Pengusaha (TPP)**	Importir/eksportir	PTSP	Loket/aplikasi	Perkuat
L-03/04	**Izin pemasukan/pengeluaran barang**	Importir/eksportir	PTSP	Aplikasi PTSP	Perkuat
L-05	**Verifikasi laporan investasi (LKPM)**	Pelaku usaha	PTSP	OSS	Perkuat
L-06	**Konsultasi dan pengaduan**	Pelaku usaha, masyarakat	PTSP; Humas	SP4N-LAPOR!	Perkuat
L-07/08	**Pelayanan kapal dan barang**	Agen kapal, perusahaan bongkar muat	UMP	Inaportnet + sistem UMP	Perkuat
L-09	**Terminal Balohan**	Penumpang, tenant	UMP	E-portal	Perkuat
L-10	**Kapal pesiar dan yacht**	Operator	UMP + Deputi KI	Inaportnet	Perkuat
L-11	**Sewa/pemanfaatan BMN dan lahan**	Pelaku usaha	Deputi KI	Loket	Perkuat
L-12	**Informasi dan alokasi lahan secara daring**	Investor	Deputi Teknik + KI	Portal lahan	Baru

Kode	Layanan	Pengguna	Penanggung jawab	Saluran	Status
L-13	**Pendampingan calon investor**	Calon investor	Deputi KI	Petugas + portal	Baru
L-14	**Pendampingan investor yang sudah beroperasi**	Investor	Deputi KI + PTSP	Petugas, OSS	Baru
L-15	**Rekomendasi tata ruang dan dokumen lingkungan**	Pelaku usaha	Deputi Teknik	OSS	Perkuat
L-16	**Data dan informasi kawasan**	Investor, publik	Biro PSI + PPID	Dasbor/portal	Baru
L-17	**Informasi publik**	Masyarakat	PPID	Portal PPID	Ada
L-18	**Informasi destinasi wisata**	Wisatawan	Deputi KI + Pemkot	Portal	Usulan

6.2 Layanan antarinstansi pemerintah

Kode	Kerja sama	Mitra	Penanggung jawab BPKS	Status
G-01	**Pencocokan izin barang dengan dokumen kepabeanan**	Bea Cukai	PTSP + Deputi Pengawasan	Perkuat
G-02	**Tim pengawasan barang konsumsi**	Bea Cukai, Karantina, aparat, Pemko	Deputi Pengawasan	Baru
G-03	**Pencocokan data kedatangan kapal**	KSOP	UMP	Perkuat
G-04	**Data kunjungan wisatawan**	Dinas Pariwisata Sabang; BPS	Biro PSI	Perkuat
G-05	**Penyelarasan tata ruang**	Pemko Sabang; Pemkab Aceh Besar	Deputi Teknik	Perkuat
G-06–08	**Perizinan dan LKPM; perencanaan; keuangan dan BMN**	Kementerian Investasi; Bappenas; Kemenkeu	PTSP; Biro PSI; Biro Keuangan/Umum	Ada
G-09	**Pengelolaan Balohan**	Dishub Aceh, ASDP, Pemko	UMP	Perkuat
G-10	**Laporan DKS ke Dewan Nasional**	Ketua DKS	Biro PSI	Perkuat

6.3 Layanan internal

Layanan yang mendukung kerja unit lain: perencanaan dan revisi anggaran (KRISNA), pembayaran (SAKTI), BMN (SIMAN v2), kepegawaian, hukum (JDIH), layanan TI dan akun tunggal Perkuat, keamanan informasi Perkuat, pengawasan internal (SIPTL), serta **layanan data internal/dasbor** Baru, yang menjadi inti paket ini.

6.4 Belajar dari kawasan lain

Kemampuan	BP Batam	BP Karimun / Bintan	BPKS	Kesimpulan
Izin berusaha lewat OSS	Ada, ditambah sistem IBOSS untuk pelabuhan dan barang Pasti	Ada (Karimun memiliki aplikasi izin penunjang) Pasti	PTSP + OSS	Kewenangan setara; perlu standar waktu dan survei kepuasan
Izin barang daring yang terhubung	Terhubung dengan OSS Pasti	Rekomendasi bongkar muat daring (Karimun) Pasti	Belum terbukti terhubung ke dokumen Bea Cukai	**Perkuat**
Layanan lahan daring	Sistem lahan terbuka untuk publik; versi baru Mei 2026 menerbitkan dokumen alokasi lahan secara otomatis Pasti	Tidak ditemukan	Tidak ada	**Baru (L-12), prioritas tertinggi**
Data terbuka	"BP Batam Open Data" Pasti		Tidak ada	**Baru (L-16)**
Pendampingan investor	Kemungkinan ada Kemungkinan Besar		Tidak ada	**Baru (L-13/14)**

Intinya

Di bawah PP 28/2025, kewenangan perizinan BPKS setara dengan BP Batam. Yang membedakan adalah **keterbukaan informasi lahan** dan **keterhubungan data**. Investor biasanya bertanya "lahan mana yang tersedia?" sebelum bertanya soal izin.

Bab 7 · Keterkaitan Antarlayanan: Empat Rantai Utama

Layanan BPKS tidak berdiri sendiri. Hasil satu layanan menjadi bahan layanan berikutnya. Bila salah satu mata rantai putus, pengguna akan bolak-balik dan data tidak nyambung. Empat rantai di bawah ini adalah usulan konsultan. B

Rantai 1: Perjalanan investor

1. **Minat** — L-13 Pendampingan
2. **Pilih lahan** — L-12 Info lahan
3. **Perjanjian lahan** — L-11 BMN
4. **Izin berusaha** — L-01 OSS
5. **Izin barang modal** — L-02/03
6. **Operasi** — L-07/08
7. **Lapor LKPM** — L-05
8. **Pendampingan lanjutan** — L-14 Aftercare

Pemilik rantai: Deputi Komersial dan Investasi. **Titik putus saat ini:** belum ada layanan lahan daring dan belum ada yang "memegang" perjalanan investor dari awal sampai akhir. Kemungkinan Besar Pendampingan setelah investasi juga penting untuk kepatuhan: menurut Peraturan BKPM 5/2025, investor yang tidak melaporkan LKPM dua periode berturut-turut, atau melapor tanpa tambahan realisasi selama empat periode di tahap persiapan, bisa dikenai sanksi. Kemungkinan Besar

Rantai 2: Perjalanan kapal dan penumpang

1. **Pengajuan kedatangan** — Inaportnet (KSOP)
2. **Tambat** — UMP
3. **Bongkar muat** — UMP
4. **Nota tagihan** — UMP
5. **Pendapatan BLU** — SAKTI
6. **Tampil di dasbor** — IKSS-3.1

Pemilik rantai: Kepala UMP. Untuk Balohan, alurnya: arus penumpang → portal dan parkir → pendapatan di SAKTI.

Rantai 3: Barang konsumsi

1. **Kuota ditetapkan** — Peraturan Kepala
2. **Permohonan izin** — Cek kuota
3. **Koordinasi** — Bea Cukai, Karantina
4. **Bongkar di dermaga** — CT-1
5. **Realisasi** — Dokumen PPFTZ
6. **Pengawasan peredaran** — Deputi Pengawasan
7. **Evaluasi kuota**

Pelajaran dari kasus beras 2025

Pada kasus izin 250 ton beras, izin terbit lebih dulu, sedangkan kuota dan tim pengawasan baru diminta setelah terjadi polemik. Rantai di atas **membalik urutannya**: kuota dan aturan pengawasan disiapkan sebelum izin diterbitkan. **Pemilik rantai:** Deputi Pengawasan.

Rantai 4: Aset menjadi pendapatan

1. **Proyek selesai** — Deputi Teknik
2. **Dicatat sebagai BMN** — Biro Umum
3. **Ditawarkan ke mitra** — Deputi KI
4. **Tarif ditetapkan** — Peraturan Kepala
5. **Ditagih** — Biro Keuangan
6. **Diawasi** — Deputi Pengawasan

7.5 Siapa membutuhkan apa dari siapa

Tabel dibaca dari kiri ke kanan: layanan di kolom kiri menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan layanan di kolom atas.

Dari ↓ / Untuk →	Izin berusaha	Izin barang	LKPM	Pelabuhan	BMN	Pendampingan	Dasbor
Info lahan	Lokasi, kesesuaian ruang				Lahan ditawarkan	Lokasi ekspansi	IKSS-6
Izin berusaha		NIB/TPP sebagai syarat	Memicu kewajiban lapor	Legalitas pengguna	Legalitas mitra	Profil izin	IKP-EH-4.1
Izin barang			Impor barang modal	Rencana bongkar			Pengawasan
Pelabuhan		Realisasi bongkar				Kinerja logistik	IKP-EH-5.2; IKSS-3.1
LKPM	Kepatuhan					Kendala investor	**IKSS-5**
BMN				Tenant			**IKSS-6**, IKP-EH-7.1

7.6 Mengapa ini memperkuat organisasi

Mengurangi kerja terpisah

Setiap rantai punya pemilik setingkat deputi yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir.

Satu data

Setiap angka punya satu sumber resmi: investasi dari LKPM, pendapatan dari SAKTI.

Akuntabilitas

Titik serah-terima antarunit menjadi titik kontrol yang diperiksa Inspektorat dan dilaporkan ke Dewan Pengawas.

Tahan perubahan

Rantai berbasis fungsi tetap berlaku walau struktur organisasi berubah.

7.7 Cara dasbor memantau rantai

Rantai	Dalam paket ini (SAKTI, KRISNA, G-form)	Rencana ke depan
Investor	Target IKSS-5 dari KRISNA; capaian dari LKPM lewat G-form	Ditarik langsung dari OSS; aplikasi pengelolaan investor
Kapal	Pendapatan dari SAKTI; jumlah kapal pesiar lewat G-form	Inaportnet dan sistem UMP
Barang	Ringkasan pencocokan izin vs realisasi lewat G-form	Aplikasi PTSP tersambung ke Bea Cukai lewat SPLP
Aset	Belanja dan pendapatan dari SAKTI; target dari KRISNA	SIMAN v2

Bab 8 · Satu Data, Satu Sumber Resmi

Prinsip "*one source of truth*" berarti setiap data hanya punya **satu sumber resmi**. Sumber lain boleh dipakai sebagai pembanding, tetapi tidak pernah ditampilkan sebagai angka kedua.

> **Perumpamaan**
>
> Jam di dinding kantor bisa berbeda-beda. Agar rapat dimulai serentak, semua orang sepakat memakai satu jam acuan. Data juga begitu: bila ada dua angka jumlah kapal, rapat akan habis untuk berdebat angka mana yang benar.

Aturan utama

1. Dasbor hanya **membaca** data dari sumbernya, tidak menyalin ulang atau mengubahnya.
2. Angka yang salah **diperbaiki di sumbernya**, bukan di laporan atau bahan paparan.
3. Laporan kinerja dan bahan paparan pimpinan **mengambil angka dari dasbor**.
4. Untuk capaian yang diisi unit lewat formulir, **dasbor sendiri yang menjadi sumber resmi**. Unit tidak boleh melaporkan angka yang sama secara terpisah ke aplikasi lain.
5. Saat formulir sementara (G-form) diganti modul isian dasbor, ada **satu tanggal pindah** tanpa masa paralel.

Data	Sumber resmi	Pemilik	Pembanding	Masuk dasbor paket ini
Target, rincian output, penandaan prioritas nasional	KRISNA	Biro PSI		Ya (sistem)
Realisasi belanja, pendapatan BLU, nilai BMN	SAKTI	Biro Keuangan/Umum	OM-SPAN	Ya (sistem)
Pemanfaatan BMN (sewa, kerja sama, BMN menganggur)	SIMAN v2 (PMK 118/2023) Pasti	Biro Umum; Deputi KI	SAKTI	G-form
Nilai IKPA	OM-SPAN Pasti	Biro Keuangan	Hitungan sendiri dari SAKTI (hanya simulasi)	G-form
Realisasi investasi; izin berusaha	OSS (LKPM yang disetujui) Pasti	PTSP	Rekap PTSP (hanya calon investor)	G-form
Izin barang	Aplikasi PTSP	PTSP		G-form
Realisasi pemasukan barang	Dokumen PPFTZ Bea Cukai	Bea Cukai	Izin PTSP (izin ≠ realisasi)	Rencana ke depan
Layanan pelabuhan BPKS	Sistem UMP, dicocokkan dengan Inaportnet tiap bulan	UMP	KSOP (total kapal ke Sabang)	G-form
Kunjungan ke destinasi wisata	Dinas Pariwisata Kota Sabang	Pemkot	BPS (definisi berbeda; tidak dijumlahkan)	G-form (rujukan)

Data	Sumber resmi	Pemilik	Pembanding	Masuk dasbor paket ini
Temuan dan tindak lanjut BPK	SIPTL BPK Pasti	Inspektorat	Catatan internal	G-form
Kode wilayah	Kepmendagri 300.2.2-2138/2025 + tabel padanan kode BPS	Biro PSI	Kode BPS	Data acuan
Klasifikasi lapangan usaha	KBLI 2025 (Peraturan BPS 7/2025) Pasti	Biro PSI		Data acuan


Celah terbesar: cakupan wilayah

Data Dinas Pariwisata dan BPS Kota Sabang tidak mencakup Pulau Breuh, Nasi, dan Teunom yang termasuk Kawasan Sabang. Semua data yang berbasis lokasi perlu diberi keterangan **"dalam/luar Kawasan Sabang"**.

Pemilihan sumber resmi untuk setiap data sebaiknya ditetapkan dalam **Keputusan Kepala BPKS tentang Satu Data BPKS**, yang juga menetapkan walidata dan penanggung jawab data di setiap unit. UU Satu Data Indonesia telah disahkan DPR pada 6 Oktober 2026, tetapi nomornya belum terbit; sampai peraturan pelaksananya ada, acuan yang berlaku tetap Perpres 39/2019.
Kemungkinan Besar

Bab 9 · Hubungan dengan RPJMN dan RPJPN

Setiap layanan BPKS sebaiknya bisa ditelusuri sampai ke tujuan pembangunan nasional. Penelusurannya seperti menaiki tangga:

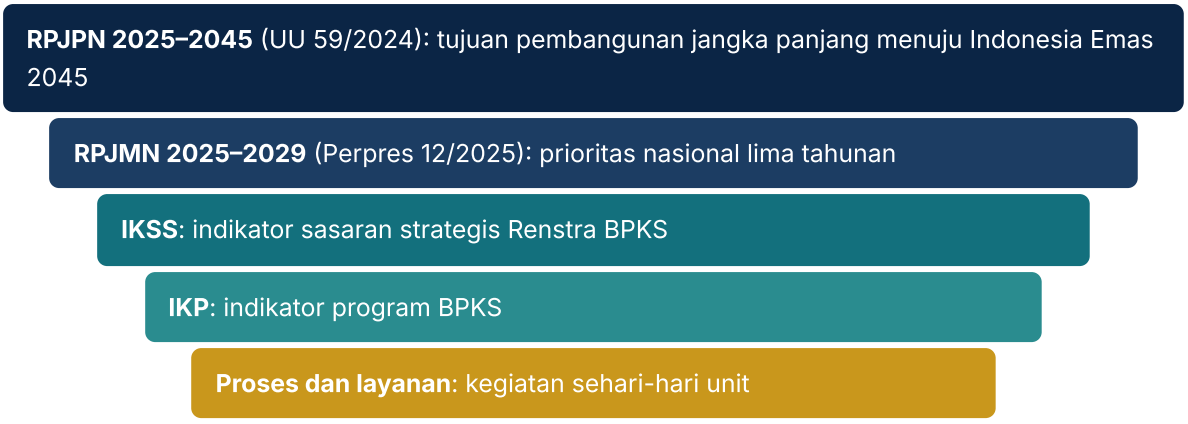

Aturannya: informasi yang tampil di menu Capaian wajib punya tangga utuh sampai RPJMN. Informasi yang tidak tertelusur hanya boleh tampil sebagai statistik pendukung. Penandaan resmi ke RPJMN diambil dari **KRISNA**, bukan ditebak konsultan.

Layanan	IKP	IKSS	Arah RPJMN/RPJPN (perkiraan)	Keyakinan
Izin, LKPM, lahan, pendampingan investor	IKP-EH-4.1, 2.2, 6.2	IKSS-5 (2026–29); IKSS-1 (2025)	Investasi dan pusat pertumbuhan kawasan	Kemungkinan Besar
Pemanfaatan BMN dan lahan	IKP-EH-3.1, 7.1, 7.2	IKSS-6; IKSS-3.1	Optimalisasi aset negara	Kemungkinan Besar
Layanan pelabuhan dan kapal pesiar	IKP-EH-1.1, 5.2	IKSS-3.1; IKSS-2.1	Konektivitas maritim; pariwisata	Kemungkinan Besar
Informasi wisata, data Pemkot	IKP-EH-1.2, 2.1	IKSS-2.3	Pariwisata berkelanjutan	Kemungkinan Besar
Tata ruang dan lingkungan	IKP-EH-1.3, 1.4	IKSS-2.2	Ekonomi hijau	Kemungkinan Besar
Data kawasan dan dasbor	IKP-WA-4.3, 4.4, 1	IKSS-7; 3.3	Transformasi digital dan satu data	Kemungkinan Besar
Keuangan	IKP-WA-1, 4.6	IKSS-7 (IKPA)	Tata kelola keuangan	Kemungkinan Besar
Pengawasan internal	IKP-WA-3, 4.2, 4.8	IKSS-4.2	Reformasi birokrasi	Kemungkinan Besar
PPBK (perikanan)	**Tidak ada**	**Tidak ada**	Ekonomi biru	**Celah Renstra**

Catatan

BPKS menyebut Sabang sebagai kawasan prioritas dalam RPJMN 2025–2029, tetapi hal ini belum kami cocokkan dengan lampiran Perpres 12/2025. Dasbor juga perlu menampilkan dua pohon kinerja (2025 dan 2026–2029) beserta tabel padanannya; tanpa itu, tren 2025 ke 2026 tidak bisa dibandingkan.

Bab 10 · Siapa Melakukan Apa

Tabel berikut memakai format **RACI**, cara sederhana membagi peran untuk setiap kegiatan:

Huruf	Singkatan dari	Artinya
R	Responsible	Yang **mengerjakan**
A	Accountable	Yang **bertanggung jawab akhir** dan menyetujui; hanya satu per kegiatan
C	Consulted	Yang **dimintai masukan**
I	Informed	Yang **diberi tahu** hasilnya

Peran disusun berdasarkan jabatan, bukan nama orang, agar tetap berlaku walau pejabat berganti. Ini usulan konsultan. B

Kegiatan	Kepala	Wakil Kepala	Dep. Umum	Dep. KI / Teknik / Pengawasan	Biro PSI	Biro Keu	Biro Umum & Humas	UMP / PTSP	Inspek-torat	PPID	CSIRT
Kesepakatan lingkup	A	C	C	C	R	I	I	I	I	I	I
Daftar data dan penjelasannya (PB-01)	I	A	C	C	R	C	C	C	C	C	I
Pengisian G-form (PB-02)	I	I	R	R	A	R	R	R	R	I	I
Pemeriksaan data (PB-03)	I	A	C	C	R	C	C	C	C	I	I
Penggabungan SAKTI/KRISNA (PB-04)	I	I	I	I	A/R	C	I	I	I	I	C
Penayangan dan daftar informasi (PB-05)	A	I	C	I	R	I	C	I	I	R	C
Hak akses dan data pribadi (PB-08)	I	A	C	I	R	I	I	C	C	C	R
Validasi peta proses dan layanan	A	C	R	R	R	R	R	R	C	C	C
Kuota barang dan tim pengawasan	A	C	R	R	I	I	I	R	C	I	I
Laporan ke Dewan Pengawas dan DKS (PB-07)	A	C	I	C	R	C	I	I	C	I	I

Konsultan berperan sebagai penyusun draf untuk PB-01, rancangan PB-04, serta peta proses dan layanan. Semua keputusan tetap di tangan BPKS.

Bab 11 · Rencana Kerja 60 Hari, Kebutuhan Data, Keputusan, dan Risiko

11.1 Rencana kerja

H1–7 **Rapat pendahuluan; pengumpulan dokumen; Berita Acara Kesepakatan Lingkup**
Hasil: Laporan Pendahuluan final; BA lingkup

H8–14 **Penyebaran G-form; wawancara pemilik indikator; telaah Pergub 17/2014**
Hasil: Daftar data draf; tugas unit terverifikasi

H15–21 **Penjelasan data (metadata); alur data SAKTI/KRISNA saat ini; peta proses tingkat atas**
Hasil: Metadata versi 1

H22–28 **FGD-1 delapan proses dasbor; diagram proses rinci**
Hasil: BA FGD-1

H29–35 **Rancangan aplikasi dasbor; peta proses per unit**
Hasil: Rancangan arsitektur versi 1

H36–42 **Peta layanan dan keterkaitannya; FGD-2**
Hasil: BA FGD-2

H43–49 **Pembagian peran (RACI); rencana sambungan SPLP; bahan Arsitektur SPBE**
Hasil: Draf Laporan Akhir

H50–56 **Ekspose kepada pimpinan**
Hasil: BA ekspose

H57–60 **Laporan Akhir dan serah terima**
Hasil: Laporan Akhir + lampiran Keluaran B

11.2 Data yang dibutuhkan dari BPKS

Kode	Dokumen/data	Unit	Tenggat
D-01	Pergub 17/2014 dan rancangan struktur organisasi baru	Deputi Umum	H+5
D-02	Renstra 2025–2029 final, Perjanjian Kinerja 2026, ekspor pohon kinerja KRISNA	Biro PSI	H+5
D-03	Ekspor data SAKTI 2025–2026	Biro Keuangan	H+10
D-04	SK 82/2022 (Tim Satu Data) dan SK walidata	Biro PSI	H+5
D-05	Arsitektur SPBE 2022–2024 dan daftar aplikasi	Biro PSI	H+7
D-06	Peraturan Kepala tentang PTSP, tarif Balohan, tarif lain, SOP perizinan	Deputi Umum / PTSP	H+10
D-07	Data layanan UMP dan Balohan	UMP	H+14
D-08	Rekap izin barang, TPP, LKPM yang diverifikasi	PTSP	H+14
D-09	Standar pelayanan dan hasil survei kepuasan per layanan	Biro Umum & Humas	H+14

Kode	Dokumen/data	Unit	Tenggat
D-10	SK CSIRT, daftar informasi publik, dokumen SPIP	Biro PSI / PPID / Inspektorat	H+14
D-11	Kesepakatan data kunjungan wisatawan dengan Pemkot	Biro PSI	H+21

11.3 Keputusan yang dimohon

1. Persetujuan Berita Acara Kesepakatan Lingkup (pembedaan A/B dan kedalaman proses).
2. Penunjukan PIC data per unit.
3. Penyelesaian indikator kembar IKP-EH-5.1/4.1 dan perlakuan PPBK di dasbor.
4. Definisi tunggal IKSS-5: nilai investasi = LKPM yang disetujui di OSS.
5. Dasbor untuk publik (L-16) atau hanya internal.
6. Nama dan garis lapor Inspektorat/SPI terhadap Deputi Pengawasan.
7. Persetujuan Keluaran B sebagai bahan Arsitektur SPBE (anggaran 2027).

11.4 Risiko dan cara mengatasinya

Peluang dan dampak dinilai 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi). Skor = peluang × dampak: 15–25 tinggi, 8–14 sedang, 1–7 rendah. Daftar lengkap dan pembaruannya ada di lembar Register Risiko.

Risiko	Peluang	Dampak	Skor	Cara mengatasi
Pekerjaan melebar di luar lingkup	4	5	Tinggi 20	BA lingkup H+7; tanda A/B dan prioritas; prosedur permintaan perubahan (F12); adendum bila perlu
Formulir terlambat atau tidak lengkap	4	5	Tinggi 20	PIC ditunjuk lewat nota dinas; pengingat H-3; eskalasi ke Wakil Kepala
Akses ekspor SAKTI/KRISNA terbatas	3	4	Sedang 12	Pakai laporan standar sistem; format minimal
Angka dasbor berbeda dengan laporan resmi	3	4	Sedang 12	Pengaman PB-04 dan PB-07; rekonsiliasi F9
Dasbor dikira aplikasi jadi	3	4	Sedang 12	Pernyataan lingkup di setiap laporan; uji penerimaan F13
Struktur organisasi baru terbit di tengah pekerjaan	3	3	Sedang 9	Peta disusun berbasis fungsi
Tugas unit resmi berbeda dari perkiraan	3	3	Sedang 9	Telaah D-01 di H8–14; validasi F6
Isu kuota barang sensitif	3	3	Sedang 9	Rantai 3 hanya usulan proses; kebijakan tetap di pimpinan
Naskah final PEMDI berbeda dari rancangan	3	2	Rendah 6	Tabel Bab 12 diperbarui saat aturan terbit

Risiko	Peluang	Dampak	Skor	Cara mengatasi
Perubahan peraturan lain (UU SDI, aturan digital)	4	2	Sedang 8	Catatan transisi di laporan

11.5 Hal yang wajib dikonfirmasi BPKS

1. **Struktur organisasi:** isi Pergub 17/2014, posisi UMP/PTSP, dan status rancangan struktur baru.
2. **SK 82/2022:** keberadaannya dan penetapan Biro PSI sebagai walidata.
3. **Deputi Pengawasan dan Inspektorat/SPI:** lingkup, garis lapor, dan pejabatnya setelah 2025.
4. **Pembagian peran pelabuhan:** BPKS sebagai pengelola dan KSOP sebagai syahbandar; kelas KSOP (Kelas IV menurut Permenhub PM 76/2018); aset Dishub Aceh di Balohan.
5. **Pulau Breuh, Nasi, Teunom:** sudah pasti termasuk Kawasan Sabang Pasti; yang perlu dikonfirmasi adalah cakupan layanan dan data BPKS di sana.
6. **Dampak PP 28/2025** terhadap pembagian kewenangan dengan Pemko Sabang dan Pemkab Aceh Besar.
7. **Status peraturan digital:** Perpres 12/2026, rancangan Perpres Pemerintah Digital, dan nomor UU Satu Data Indonesia.

Bab 12 · Keselarasan dengan Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)

Evaluasi SPBE sedang beralih ke **Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)**: 20 indikator dalam 7 aspek, dinilai melalui platform penilaian KemenPANRB. Perbedaan utamanya, PEMDI tidak hanya menilai kesiapan pengelola (hulu), tetapi juga **kepuasan pengguna layanan** (hilir). Aspek Kepuasan Pengguna memiliki bobot terbesar, 25%. Kemungkinan Besar

> **Catatan sumber**
>
> Rincian di bab ini mengacu pada pemetaan SPBE ke PEMDI dan penjabaran bukti dukung Level 1–5 yang disusun dari **rancangan** Peraturan Menteri PANRB 2026. Bila naskah final berbeda, tabel ini perlu disesuaikan. Indikator 18 dan 19 belum dijabarkan pada sumber acuan.

12.1 Cara membaca prioritas

Tanda	Arti
P1	**Wajib dirancang dalam paket ini** karena langsung dibutuhkan dasbor.
P2	**Dirancang lengkap**; dilaksanakan bila disepakati dalam BA lingkup atau masuk rencana 2027.
P3	**Peta jalan**; dicatat sebagai bahan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital BPKS.

12.2 Peta 20 indikator terhadap rancangan

1. Tata Kelola dan Manajemen

No	Indikator	Bukti dukung yang diharapkan (ringkas)	Kondisi saat ini	Yang dirancang	Jenis / prioritas
1	**Tata Kelola Pemerintah Digital**	L1 rancangan Fasilitas Dukungan Pengguna (FDP), draf SOP layanan, rancangan pemantauan SLA; L2 SLA ditetapkan dan dasbor SLA; L3 terhubung sistem nasional; L4 reviu SLA/FDP; L5 tindak lanjut 100%	Belum ada FDP dan SLA formal Menebak	FDP dasbor, SOP layanan data, tabel SLA, panel SLA di dasbor (Bab 13)	A P1
2	**Manajemen Layanan Digital**	Kebijakan/SOP lima area: risiko, perubahan, pengetahuan, keberlangsungan, relasi pengguna; L2 register risiko/logbook; L3 platform terpadu; L4 reviu; L5 kontribusi ke platform nasional	Belum dirancang Kemungkinan Besar	Lima area untuk layanan dasbor: register risiko, prosedur perubahan, basis pengetahuan, rencana keberlangsungan, forum pengguna (Bab 13–14)	A B P2

2. Penyelenggara

No	Indikator	Bukti dukung yang diharapkan (ringkas)	Kondisi saat ini	Yang dirancang	Jenis / prioritas
3	**SDM Pemerintah Digital**	L1 peta kompetensi digital ASN; L2–L3 peningkatan kompetensi (>20% s.d. >90% ASN); L4 komunitas belajar, pemanfaatan AI dan analisis data; L5 sertifikasi keahlian digital	Belum diketahui Menebak	Peta kompetensi peran data (walidata, produsen data, operator, pengguna pimpinan) dan rencana pelatihan pengguna dasbor	A B P2
4	**Kolaborasi Pemerintah Digital**	L1 SK Tim Koordinasi Pemdi dan rencana kolaborasi di Renstra; L2 notulen, undangan; L3 MoU/PKS dan gambar arsitektur integrasi; L4 reviu; L5 tindak lanjut	SK 82/2022 Tim Satu Data ada, isinya belum dicek Kemungkinan Besar	SK Tim Koordinasi Pemdi dan Satu Data BPKS; kesepakatan data dengan Pemkot dan Kementerian Investasi; gambar arsitektur integrasi	A P1

3. Data

No	Indikator	Bukti dukung yang diharapkan (ringkas)	Kondisi saat ini	Yang dirancang	Jenis / prioritas
5	**Satu Data Indonesia (nilai SDI dari Bappenas)**	Dataset terdaftar dan dimutakhirkan di Portal SDI; Level 5 bila nilai SDI 75–100	Walidata, metadata, satu sumber resmi sudah dirancang	Tambah pendaftaran dataset Statistik BPKS ke Portal SDI di PB-05	A P1
6	**Informasi geospasial (nilai dari BIG)**	Bergantung pada nilai indeks dari instansi pembina Kemungkinan Besar	Peta lokasi Kegiatan Utama direncanakan	Metadata geospasial lokasi proyek dan lahan; rencana simpul jaringan	A B P2
7	**Statistik sektoral (nilai dari BPS)**	Bergantung pada nilai indeks dari instansi pembina Kemungkinan Besar	Metadata indikator dirancang	Metadata statistik setiap indikator; rekomendasi kegiatan statistik bila ada survei	A P2
8	**Pelindungan Data Pribadi**	L5: tindak lanjut evaluasi tata kelola PDP dan perbaikan berkelanjutan	PB-08 sudah ada	Register pemrosesan data pribadi untuk dasbor, formulir, survei; penilaian dampak ringan	A P1

4. Keamanan

No	Indikator	Bukti dukung yang diharapkan (ringkas)	Kondisi saat ini	Yang dirancang	Jenis / prioritas
9	**Audit Keamanan**	L1 program pengawasan tahunan berbasis risiko; L5 laporan audit dan tindak lanjut 100%	Belum dirancang	Dasbor dimasukkan ke rencana audit keamanan tahunan	B P3
10–12	**Keamanan informasi (IKASANDI, BSSN)**	L1–L2 identifikasi Infrastruktur Informasi Vital dan penilaian mandiri; L5 verifikasi BSSN nilai 4,00–5,00	CSIRT disebut, SK perlu dicek	Dasbor dicatat dalam inventaris aset; penguatan CSIRT; kontrol akses dan log di arsitektur	A B P2

5. Teknologi

No	Indikator	Bukti dukung yang diharapkan (ringkas)	Kondisi saat ini	Yang dirancang	Jenis / prioritas
13	**Aplikasi**	L1 dokumentasi SDLC; L3 pengembangan selaras arsitektur; L4 repositori aplikasi; L5 satu ekosistem	F4 Inventaris Aplikasi setara bahan repositori	Dokumen SDLC dasbor (kebutuhan, desain, uji); repositori aplikasi dari F4; arsitektur aplikasi dasbor	A P1
14	**Infrastruktur**	L2 sebagian layanan di cloud; L5 terintegrasi penuh dengan Pusat Data Nasional	Kolom hosting di F4	Rekomendasi penempatan dasbor di Pusat Data Nasional	A P2

6. Keterpaduan Layanan

No	Indikator	Bukti dukung yang diharapkan (ringkas)	Kondisi saat ini	Yang dirancang	Jenis / prioritas
15	**Proses bisnis lintas sektor**	L5 laporan optimalisasi keterpaduan proses bisnis lintas sektor	Rantai layanan dan peta proses sudah dirancang	Empat rantai layanan; validasi proses (F6)	A B P1
16	**Integrasi**	L5 matriks pemantauan integrasi otomatis, terhubung dasbor nasional	Rencana SPLP sudah ada	Matriks integrasi sistem × status sambungan; peta jalan SPLP	A P1
17	**Portal layanan**	L5 portal layanan tunggal berpusat warga, terintegrasi nasional	L-16 data kawasan diusulkan	Portal data dan layanan kawasan; tautan ke portal pelayanan publik nasional	B P2
18–19	**Belum dijabarkan di acuan**	Tidak dijabarkan pada sumber acuan		Cek naskah RPermen PANRB terbaru	B Cek

7. Kepuasan Pengguna (bobot 25%)

No	Indikator	Bukti dukung yang diharapkan (ringkas)	Kondisi saat ini	Yang dirancang	Jenis / prioritas
20	**Pengelolaan kepuasan pengguna layanan digital**	L1 data kepuasan dari portal, data transaksi 1 tahun, pelibatan kelompok rentan; L3 mystery guest, dasbor kepuasan real-time, partisipasi >40%, nilai >3; L5 log perubahan layanan dipublikasikan, forum konsultasi publik tiap semester	Survei baru untuk pengguna internal dasbor	Lima instrumen kepuasan publik, panel kepuasan di dasbor, F10 Survei Layanan Publik (Bab 13)	A P1

12.3 Skala penilaian

PEMDI memakai lima tingkat predikat, dari **Kurang (Initiate)** sampai **Memuaskan (Leading)**. Nilai Indeks SPBE lama tidak bisa langsung dibandingkan dengan Indeks PEMDI karena skalanya berbeda. Kemungkinan Besar Lembar **F11 Kesiapan PEMDI** di Excel dipakai untuk penilaian mandiri awal: level saat ini, bukti yang sudah ada, target, dan kesenjangannya.

Mengapa ini penting untuk dasbor

Dasbor yang dirancang dengan benar bisa sekaligus menjadi **bukti dukung** beberapa indikator PEMDI: dasbor SLA (Indikator 1), dataset terdaftar (Indikator 5), repositori dan dokumentasi aplikasi (Indikator 13), matriks integrasi (Indikator 16), dan dasbor kepuasan publik (Indikator 20).

Bab 13 · Rancangan Kepuasan Pengguna dan Dukungan Pengguna

Bab ini menjawab Indikator 1, 2, dan 20 PEMDI. Ada dua kelompok pengguna yang perlu dibedakan:

- **Pengguna layanan BPKS** (pelaku usaha, investor, operator kapal, penumpang, masyarakat). Kepuasan mereka adalah ukuran manfaat utama dalam PEMDI.
- **Pengguna dasbor** (pimpinan dan unit). Kepuasan mereka diukur dengan IKP-WA-4.3.

13.1 Lima instrumen kepuasan layanan publik

Instrumen	Cara kerja	Frekuensi	Penanggung jawab
Penilaian singkat (widget)	Satu klik skala 1–4 dan kolom komentar di setiap kanal digital: aplikasi PTSP, e-portal Balohan, portal data kawasan	Setiap transaksi	Unit pemilik layanan
Survei kepuasan layanan digital	9 unsur survei kepuasan masyarakat (PermenPANRB 14/2017), per layanan (lembar F10)	Triwulanan	Biro Umum dan Humas
Mystery guest	Petugas atau pihak independen menyamar sebagai pengguna untuk layanan prioritas: izin barang, Balohan, informasi lahan	Semesteran	Inspektorat/SPI
Forum konsultasi publik	Pelaku usaha, operator kapal, Pemkot, perwakilan kelompok rentan	Tiap semester	Deputi terkait + Humas
Log perubahan layanan	Daftar perbaikan yang dilakukan berdasarkan masukan, dipublikasikan	Setiap ada perubahan	Pemilik layanan

13.2 Pelibatan kelompok rentan

Kelompok rentan dalam konteks Sabang antara lain penyandang disabilitas, lansia, pelaku usaha mikro, dan nelayan kecil. Menebak Rancangannya: setiap survei mencatat apakah responden termasuk kelompok rentan; kanal layanan menyediakan alternatif non-digital; dan forum konsultasi mengundang perwakilan mereka.

13.3 Target yang dirujuk

- Data transaksi layanan tersedia untuk 12 bulan terakhir.
- Partisipasi survei lebih dari 40% pengguna layanan.
- Nilai kepuasan lebih dari 3 pada skala 4.
- Log perubahan dan forum konsultasi publik paling sedikit tiap semester.

Target di atas berasal dari penjabaran bukti dukung PEMDI Level 3–5. Kemungkinan Besar

13.4 Panel kepuasan di dasbor

Dasbor menampilkan untuk setiap layanan: nilai kepuasan dan trennya, jumlah transaksi, jumlah aduan dan waktu tindak lanjut, partisipasi survei, serta tautan log perubahan. Panel ini dapat dibuka untuk publik sebagai bukti keterbukaan.

13.5 Fasilitas Dukungan Pengguna (FDP) dan SLA dasbor

FDP adalah "meja bantuan" bagi pengguna dasbor: satu kanal resmi (email dinas dan formulir), jam layanan yang jelas, dan dua tingkat penanganan (admin Biro PSI, lalu Tim SI). Usulan SLA:


Jenis permintaan	Target waktu	Penanggung jawab
Pertanyaan atau bantuan penggunaan	≤ 1 hari kerja (tanggapan pertama)	Biro PSI (admin dasbor)
Gangguan akses dasbor	≤ 4 jam kerja	Tim SI
Permintaan atau pencabutan akun	≤ 2 hari kerja / ≤ 1 hari kerja	Tim SI
Koreksi angka	≤ 5 hari kerja, melalui PB-03	Walidata dan unit pemilik data
Permintaan fitur baru	Dicatat, diputuskan dalam rapat bulanan	Kabiro PSI
Insiden keamanan	Sesuai prosedur CSIRT	CSIRT

Pencapaian SLA ditampilkan di panel admin dasbor sebagai bukti Indikator 1.

13.6 Lima area manajemen layanan dasbor

Area	Wujud rancangan	Penanggung jawab
Risiko	Register risiko layanan dasbor (lembar Register Risiko)	Kabiro PSI
Perubahan	Prosedur permintaan perubahan (lembar F12)	Kabiro PSI
Pengetahuan	Panduan pengguna, glosarium, tanya jawab, catatan keputusan data	Biro PSI
Keberlangsungan	Cadangan data berkala, rencana pemulihan, penanggung jawab cadangan	Tim SI
Relasi pengguna	Forum pengguna internal, survei kepuasan pengguna dasbor, kanal umpan balik	Biro PSI

13.7 Siklus perbaikan



Bab 14 · Manajemen Proyek

Bab ini memuat alat pengendalian pekerjaan agar 60 hari berjalan sesuai rencana.

14.1 Piagam proyek (Project Charter)

Butir	Isi
Nama pekerjaan	Penyusunan Proses Bisnis dan Arsitektur Aplikasi Dasbor Kawasan Sabang
Pemberi kerja / sponsor	Kepala BPKS, c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi
Tujuan terukur (usulan)	1) 100% indikator Renstra 2025–2029 tingkat program memiliki definisi, pemilik, dan sumber resmi. 2) Purwarupa dasbor menampilkan angka nyata untuk minimal 80% indikator yang datanya tersedia. 3) Waktu penyiapan bahan rapat kinerja dapat diukur sebelum dan sesudah (baseline diambil saat pekerjaan).
Lingkup	Keluaran A (proses dasbor PB-01 s.d. PB-08 dan arsitektur aplikasi dasbor) dan Keluaran B (masukan Arsitektur/Peta Rencana Pemdi BPKS), sesuai Bab 2
Durasi dan biaya	60 hari kalender; nilai sesuai kontrak
Risiko utama	Pelebaran lingkup; formulir terlambat; akses data SAKTI/KRISNA terbatas (Bab 11)
Ketua tim konsultan	[diisi]
Kriteria sukses	BA lingkup ditandatangani H+7; seluruh unit mengembalikan F1–F3; FGD-1 dan FGD-2 menghasilkan BA; uji penerimaan purwarupa lulus ≥ 90% butir; BAST ditandatangani H+60
Kewenangan perubahan	Perubahan kecil yang tidak menambah keluaran disetujui Kabiro PSI bersama ketua tim. Perubahan yang menambah keluaran atau waktu diputuskan PPK. Perubahan nilai atau jangka waktu kontrak melalui adendum.

14.2 Struktur rincian kerja (WBS)

No	Paket kerja	Keluaran
1	**Manajemen proyek**	BA lingkup; laporan mingguan; rapat koordinasi; pengendalian perubahan
2	**Pengumpulan data**	Formulir F1–F3, F4; wawancara pimpinan (F5); daftar periksa dokumen
3	**Analisis**	Kondisi saat ini; metadata; rekonsiliasi sumber (F9); satu sumber resmi
4	**Rancangan proses**	BPMN PB-01 s.d. PB-08; peta proses per unit; katalog dan rantai layanan
5	**Arsitektur dasbor**	Arsitektur data, aplikasi, integrasi (matriks dan SPLP), keamanan
6	**UI/UX**	Wireframe; purwarupa; uji kegunaan
7	**Kepuasan dan dukungan pengguna**	FDP dan SLA; instrumen kepuasan; panel kepuasan
8	**Keselarasan PEMDI**	Penilaian mandiri 20 indikator (F11); rencana aksi

No	Paket kerja	Keluaran
9	**Tata kelola**	RACI; hak akses (F8); draf SK Kepala BPKS
10	**Penutupan**	Laporan Akhir; uji penerimaan (F13); BAST

14.3 Tonggak dan jalur kritis

Jalur kritis adalah rangkaian kegiatan yang bila satu saja terlambat, seluruh pekerjaan ikut terlambat.

Kode	Tonggak	Target	Bergantung pada	Jalur kritis?
M1	BA Kesepakatan Lingkup	H+7		Ya
M2	F1–F3 kembali dari unit	H+14 / H+21	M1	Ya
M3	FGD-1 proses dasbor	H+28	M2	Ya
M4	Arsitektur dasbor versi 1 dan purwarupa	H+35	M3	Ya
M5	FGD-2 layanan, hak akses, SLA	H+42	M4	Ya
M6	Draf Laporan Akhir	H+49	M5	Ya
M7	Ekspose pimpinan dan uji penerimaan	H+56	M6	Ya
M8	Laporan Akhir dan BAST	H+60	M7	Ya
S1	F4 Aplikasi TIK dan wawancara pimpinan	H+21	M1	Tidak (ada kelonggaran)
S2	Survei kepuasan pengguna purwarupa	H+56	M4	Tidak

> **Titik paling rawan**
>
> M2 (formulir kembali dari unit). Bila terlambat satu minggu, FGD-1 dan seluruh tonggak berikutnya ikut mundur. Karena itu PIC unit perlu ditunjuk melalui nota dinas sejak minggu pertama.

14.4 Rencana komunikasi


Jenis	Frekuensi	Penerima	Cara
Laporan kemajuan mingguan	Mingguan	Kabiro PSI	Email + rapat singkat 30 menit
Rapat koordinasi tim teknis	Dua mingguan	PIC unit, Tim SI	Rapat
Laporan kepada pimpinan	Pada tonggak M1, M3, M5, M7	Kepala, Wakil Kepala, Deputi	Paparan
FGD	H+28 dan H+42	Unit terkait, mitra bila perlu	Lokakarya + BA
Pemberitahuan formulir	Saat distribusi dan pengingat H-3	PIC unit	Nota dinas + email

Jenis	Frekuensi	Penerima	Cara
Eskalasi masalah	Bila tenggat terlewati 3 hari	Wakil Kepala	Nota dinas

14.5 Peta pemangku kepentingan

Kelompok	Siapa
Kelola erat (pengaruh tinggi, kepentingan tinggi)	Kepala, Wakil Kepala, Kabiro PSI, Deputi Komersial dan Investasi
Jaga kepuasan (pengaruh tinggi, kepentingan sedang)	Dewan Pengawas, Deputi lain, PPK
Beri informasi (pengaruh sedang, kepentingan tinggi)	PIC data unit, UMP, PTSP, Biro Keuangan
Pantau (pengaruh rendah s.d. sedang)	Pemko Sabang, Pemkab Aceh Besar, Kementerian Investasi, KSOP, Bea Cukai, BPS

14.6 Prosedur permintaan perubahan



Setiap permintaan di luar BA lingkup dicatat di lembar **F12 Permintaan Perubahan**, dinilai dampaknya terhadap lingkup, waktu, dan biaya, lalu diputuskan oleh pihak yang berwenang sesuai piagam proyek.

14.7 Uji penerimaan purwarupa

Purwarupa dinyatakan diterima bila minimal 90% butir berikut lulus (lembar F13):

1. Halaman Beranda menampilkan capaian IKSS 2025 dan 2026–2029 secara terpisah
2. Setiap angka menampilkan sumber dan tanggal pemutakhiran
3. Target sama dengan data KRISNA
4. Realisasi keuangan sama dengan SAKTI pada tanggal yang sama
5. Indikator tanpa data tampil sebagai "belum tersedia", bukan nol
6. Filter periode dan unit berfungsi
7. Hak akses sesuai matriks F8 (diuji dengan 3 peran)
8. Peta Kegiatan Utama menampilkan lokasi PKS, PTKS, PPBK
9. Panel kepuasan dan panel SLA tampil
10. Dapat dibuka di laptop dan tablet pimpinan
11. Panduan pengguna tersedia

14.8 Daftar serah terima (BAST)

1. Laporan Pendahuluan, Antara (bila ada), dan Akhir

2. Dokumen BPMN PB-01 s.d. PB-08
3. Dokumen arsitektur aplikasi dasbor
4. Purwarupa dan berkas desainnya
5. Draf SK Kepala BPKS
6. Rekap formulir (Excel) dan metadata
7. Hasil uji penerimaan
8. BA FGD dan ekspose
9. Daftar perubahan yang disetujui

Glosarium

Istilah	Penjelasan
Arsitektur SPBE	Cetak biru penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintah: proses, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan, dan layanan (Perpres 132/2022).
As-is / To-be	Cara kerja saat ini / cara kerja yang dituju setelah perbaikan.
BAST	Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan.
BLU	Badan Layanan Umum: instansi pemerintah yang boleh mengelola langsung pendapatan dari layanannya.
BMN	Barang Milik Negara, misalnya tanah, gedung, dermaga, dan kendaraan.
Dasbor	Tampilan layar yang merangkum angka penting dalam grafik, peta, dan tabel.
FDP	Fasilitas Dukungan Pengguna: meja bantuan resmi bagi pengguna layanan digital.
FGD	Focus Group Discussion: diskusi terarah untuk membahas dan menyepakati usulan.
G-form	Google Form: formulir daring untuk mengumpulkan isian dari unit.
HPL	Hak Pengelolaan atas tanah yang dipegang BPKS.
IKASANDI	Indeks Keamanan Informasi dan Persandian yang dinilai BSSN.
IKPA	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran, dinilai Kementerian Keuangan.
IKSS / IKP	Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Program dalam Renstra.
Inaportnet	Sistem layanan kapal milik Kementerian Perhubungan, dipakai KSOP.
Jalur kritis	Rangkaian kegiatan yang bila terlambat membuat seluruh pekerjaan terlambat.
KPBPB	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
KRISNA	Sistem perencanaan dan penganggaran bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.
KSOP	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Kementerian Perhubungan).
LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang wajib disampaikan investor melalui OSS.
Metadata	Keterangan tentang data: definisi, rumus, satuan, sumber, dan jadwal pembaruan.
Mystery guest	Penilai yang menyamar sebagai pengguna untuk menguji layanan apa adanya.
OM-SPAN	Aplikasi pemantauan anggaran Kementerian Keuangan; tempat nilai IKPA resmi.
OSS	Online Single Submission: sistem perizinan berusaha nasional.
PEMDI	Indeks Pemerintah Digital: kerangka evaluasi pengganti Indeks SPBE, 20 indikator dalam 7 aspek.
PPFTZ	Dokumen kepabeanan untuk pemasukan/pengeluaran barang di kawasan bebas, diproses Bea Cukai.
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: melayani permohonan informasi publik.
Project Charter	Piagam proyek: tujuan, lingkup, kewenangan, dan kriteria sukses pekerjaan.
Proses bisnis	Urutan kegiatan untuk menghasilkan suatu keluaran atau layanan.
RACI	Pembagian peran: yang mengerjakan, yang bertanggung jawab akhir, yang dimintai masukan, yang diberi tahu.
Renstra	Rencana Strategis BPKS lima tahunan.

Istilah	Penjelasan
RPJMN / RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (5 tahun) / Jangka Panjang Nasional (20 tahun).
SAKTI	Sistem aplikasi keuangan instansi milik Kementerian Keuangan.
SIMAN v2	Sistem pengelolaan BMN Kementerian Keuangan (DJKN).
SIPTL	Sistem pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
SLA	Service Level Agreement: janji waktu penanganan layanan, misalnya tanggapan dalam 1 hari kerja.
SPLP	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah: "jembatan" resmi pertukaran data antarinstansi, dikelola Komdigi.
UAT	User Acceptance Test: uji penerimaan oleh pengguna sebelum hasil diterima.
Walidata	Unit yang mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan data instansi (Perpres 39/2019).
WBS	Work Breakdown Structure: pemecahan pekerjaan menjadi paket-paket keluaran.

Lampiran: Dasar Hukum dan Sumber Rujukan

A. Dasar hukum

Peraturan	Pokok isi	Status
UU 37/2000 (Perpu 2/2000)	Pembentukan KPBPB Sabang	Pasti
UU 11/2006	Pemerintahan Aceh; DKS diketuai Gubernur	Pasti
PP 83/2010	Pelimpahan kewenangan kepada DKS; cakupan wilayah Kawasan Sabang	Pasti
PP 105/2012	Pengelolaan keuangan BPKS (BLU)	Pasti
PP 41/2021	Penyelenggaraan KPBPB; barang konsumsi	Pasti
PP 28/2025	Perizinan berusaha berbasis risiko; peran Badan Pengusahaan KPBPB	Pasti
Peraturan BKPM 5/2025	Pedoman OSS dan LKPM	Pasti
Perka BPKS 71/2022	Tarif jasa dan pemanfaatan BMN di Pelabuhan Balohan	Pasti
Perpres 39/2019	Satu Data Indonesia	Pasti
UU Satu Data Indonesia	Disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor belum terbit	Kemungkinan Besar
Perpres 95/2018; Perpres 132/2022	SPBE; Arsitektur SPBE	Pasti
Perpres 82/2023	Percepatan transformasi digital dan aplikasi prioritas	Pasti
Permenkominfo 1/2023; SE Menkominfo 4/2024	Interoperabilitas data; pemanfaatan SPLP	Pasti
Permenkomdigi 12/2026	Manajemen aset TIK dan layanan SPBE	Pasti
Perpres 12/2026	Digitalisasi pelayanan publik	Kemungkinan Besar
UU 27/2022	Pelindungan Data Pribadi	Pasti
PermenPANRB 19/2018; 15/2014; 14/2017	Peta proses bisnis; standar pelayanan; survei kepuasan masyarakat	Pasti
Perpres 12/2025; UU 59/2024	RPJMN 2025–2029; RPJPN 2025–2045	Pasti
PMK 118/2023	Pengelolaan BMN melalui SIMAN	Pasti
Peraturan BPK 2/2017	Pemantauan tindak lanjut melalui SIPTL	Pasti
Kepmendagri 300.2.2-2138/2025	Kode wilayah administrasi	Pasti
Peraturan BPS 7/2025	KBLI 2025	Pasti
Rancangan PermenPANRB 2026	Evaluasi Pemerintah Digital (PEMDI), 20 indikator	Kemungkinan Besar

B. Sumber rujukan utama

- bpks.go.id/about
- jdih.acehprov.go.id (Pergub 17/2014)
- jdih.setkab.go.id (PP 83/2010)
- peraturan.bpk.go.id (PP 28/2025; Perpres 39/2019)
- jdih.komdigi.go.id (Permenkominfo 1/2023; SE 4/2024)

- dishub.acehprov.go.id (pengelolaan Balohan oleh BPKS sejak 1 Jan 2024)
- ump.bpks.go.id/service (layanan UMP)
- kanwilaceh.beacukai.go.id; republika.co.id; merdeka.com (kasus pemasukan beras 2025)
- theacehpost.com; atjehwatch.com (pelantikan deputi Oktober 2025)
- medianangroe.com (rapat Dewas–manajemen Agustus 2025)
- ptsp.bpbatam.go.id; sip.bpkarimun.com; batam.go.id (pembanding kawasan lain)
- jdih.kemenkeu.go.id (PMK 118/2023)
- data.go.id (Forum SDI; Kode Referensi Indikator Pembangunan)
- menpan.go.id (Arsitektur SPBE; Perpres 82/2023)
- hubla.dephub.go.id (Inaportnet)
- pemdi.isoc.id (pemetaan SPBE ke PEMDI; bukti dukung PEMDI Level 1–5; modul MPSI)

Keterbatasan

- Uraian tugas tiap unit tidak dapat dicek dari teks Pergub 17/2014.
- Isi Renstra diambil dari peta halaman utama dasbor dari BPKS, bukan dokumen Renstra yang ditetapkan.
- Status Sabang sebagai prioritas RPJMN belum dicek pada lampiran Perpres 12/2025.
- Bab 5 (Keluaran B), Bab 6, Bab 7, Bab 12, Bab 13, dan pembagian peran adalah **usulan konsultan** yang baru mengikat setelah disepakati dalam Berita Acara FGD.
